

Projekta ieviešanas nosacījumi

Ieva Lazdiņa

SIA “Vides investīciju fonds”

2016. gada 11. oktobris



Vides investīciju fonds

- ✓ Organizē projektu iesniegumu vērtēšanu
- ✓ Uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ Pārbauda projektu īstenošanu iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu
- ✓ Veic projektu rezultātu monitoringu
- ✓ Veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Pieejamas **projektu ieviešanas vadlīnijas** finansējuma saņēmējiem, kas ir balstītas uz vadlīnijām projekta iesniedzējiem piemēra

Līgums

- iepirkumu plāns
- maksājumu prognoze
- avanss

Ieviešana

- iepirkumu veikšana
- pārskati, maksājumu pieprasījumi
- grozījumi
- publicitātes un demonstrēšanas pasākumi

Monitorings

- monitoringa pārskati
- demonstrēšanas pasākumi
- dokumentu un rezultātu uzglabāšana

Iepirkumu pārbaude

- Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Fondā jāiesniedz projekta **iepirkumu plāns – līguma 1.pielikums**
- Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un līguma noslēgšanas, Fondā jāiesniedz **iepirkumu dokumentācija**

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas).

Nav atļauts iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas!

Iepirkuma metodes


Publisko iepirkumu likums
(PIL)

MK noteikumi Nr.299
"Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās
piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem
projektiem"

Zaļais
iepirkums

Fonds pārbauda projektu ietvaros veikto iepirkumu **atbilstību normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un zaļā publiskā iepirkuma un ilgtspējīgas būvniecības principiem**

Pieejamie maksājumi

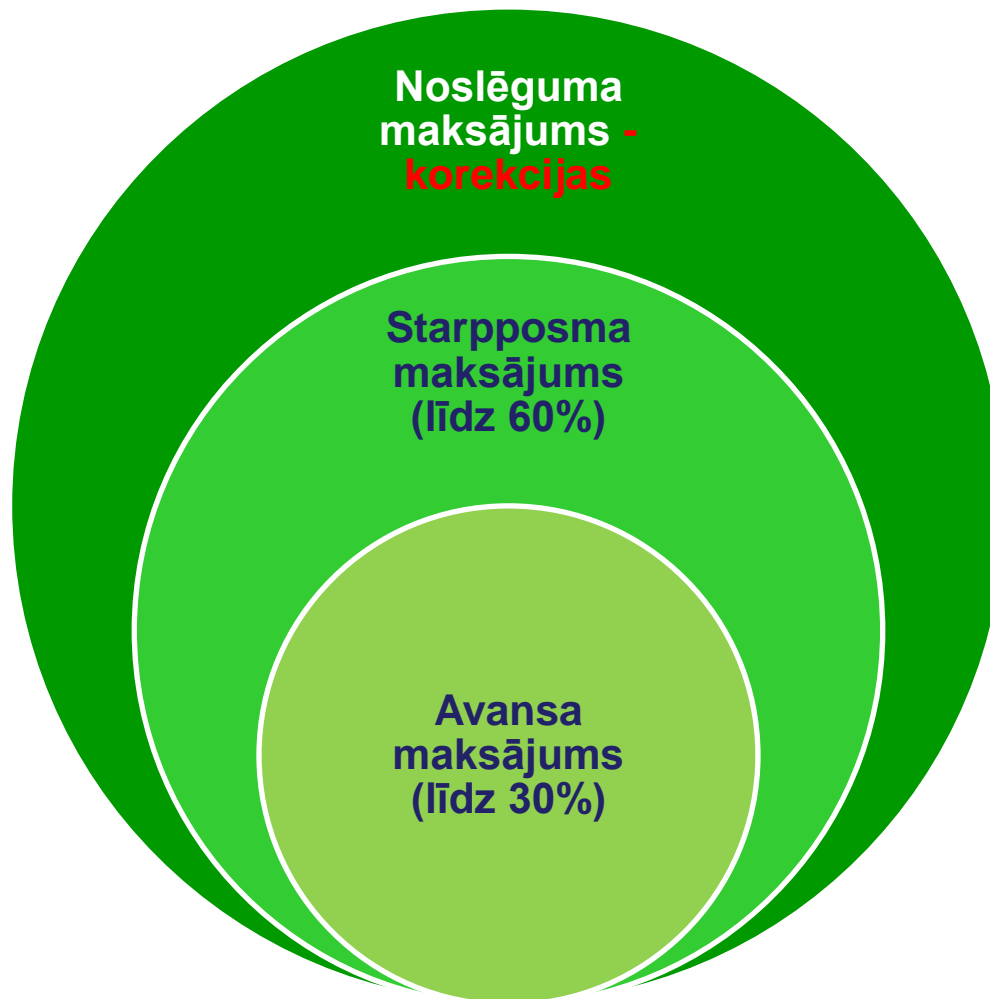

Projekts un projekta līgums



Projekta īstenošanas laikā:

- ✓ jāievēro projekta līguma nosacījumi
- ✓ jāievēro projekta iesniegumā paredzētais (t.sk. tehniskajā dokumentācijā paredzētais)
- ✓ jānodrošina, ka tiek ievēroti piegādes un būvdarbu līgumu nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.)
- ✓ pēc Fonda rakstiska pieprasījuma, jāiesniedz Fondā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze atbilstoši projekta plānotajam grafikam un **ņemot vērā projekta ieviešanas un pārskatu iesniegšanas termiņus**

Svarīgi!

Sekot līdz faktiskajai būvdarbu/pakalpojumu līgumu izpildei, par novirzēm no līguma laicīgi jāinformē Fonds

Kas jāņem vērā ieviešot projektu?

- ✓ Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs. Jābūt pieejamiem segto darbu pieņemšanas aktiem
- ✓ Ja ir veikts iepirkums, jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu izpildes termiņi netiek pārsniegti, jo tas ietekmē iepirkuma procedūru
- ✓ Būvniecības lokālajās tāmēs **komplekti ir jāatšifrē**, norādot darbus, materiālus, mērvienības

Kas jāņem vērā ieviešot projektu?

- ✓ Tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība, t.sk. pildīts būvdarbu žurnāls, kas reģistrēts būvvaldē
- ✓ Faktiskie būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā

SVARĪGI!

Veicot izmaiņas būvniecības laikā, izmaiņas ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā, t.sk. izmaiņas jāaskaņo ar neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā!

Biežāk pieļautās kļūdas

- Būvdarbi nav/netiek veikti atbilstoši projekta līgumam:
 - ir veikti papilddarbi, kas nav saskaņoti, vai nav veikti kādi darbi, kas paredzēti projektā vai veiktajā iepirkuma procedūrā
 - projektā paredzēto materiālu vietā tiek izmantoti citi materiāli, kas nav saskaņoti ar Fondu
 - atbalsts tiek prasīts par darbiem un materiāliem, kas faktiski nav veikti/izmantoti
 - būvdarbi netiek veikti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, t.sk. energoaudita pārskatam
 - būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi
 - tiek izmantoti sliktākas kvalitātes materiāli, nekā ir paredzēts projektā

Biežāk pieļautās kļūdas (II)

- Ar būvdarbiem saistītā izpilddokumentācija netiek aizpildīta/noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
 - aktus par izpildītiem darbiem (forma 2) nav parakstījis darbu veicējs, pasūtītājs un būvuzraugs
 - aktos par izpildītiem darbiem (forma 2) norādītie veiktie darbi, apjomi un cenas atšķiras no būvniecības līgumā un iepirkuma procedūrā paredzētā un faktiski veiktajiem
 - izmaiņas tehniskajā dokumentācijā netiek veiktas
 - kvalitatīvi netiek aizpildīts būvdarbu žurnāls un segto darbu akti
 - būvdarbi tiek veikti ar nezināmas izcelsmes materiāliem. Nav pieejamas materiālu kvalitātes atbilstības deklarācijas
 - pārskatā par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādīto risinājumu maiņa nav saskaņota ar neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā un Fondu

Projekta konts



Visus norēķinus projekta ietvaros pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs veic izmantojot atvērto bankas norēķinu kontu!

- jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta, var tikt atzītas par neattiecināmām izmaksām!
- projekta kontu drīkst izmantot tikai ar projektu saistīto izdevumu veikšanai

Ja projekta līgumā norādīts konts, kurš nav speciāli atvērtais projekta konts, Fondu līdz maksājumu veikšanai projekta ietvaros, jāinformē par atvērto speciālo projekta kontu!

Nodalīta grāmatvedība

- Izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas
- Kontu plānam vai grāmatvedības uzskaites politikai ir jābūt apstiprinātai ne vēlāk kā projekta līguma parakstīšanas dienā



Svarīgi!

Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis

Grāmatvedības uzskaitē

- Jāietver visi ar projekta īstenošanu saistītie konti un subkonti
- Kontu plānu noformē vienotā stilā
- Uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem jānorāda grāmatojums un summas konta debets un kredīts
- Projekta izmaksām, kas radušās pirms projekta līguma noslēgšanas, jābūt pārgrāmatotām ar projekta īstenošanu saistītos grāmatvedības kontos, norādot grāmatojumus uz attaisnojuma dokumentiem
- Visas izmaksas iekļaujamās kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi finansējuma saņēmēja aktīvos

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā



- ❑ pirmslīguma pārbaude
- ❑ pārbaudes projekta īstenošanas laikā – vismaz vienu reizi projekta ieviešanas laikā
- ❑ pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas (5 gadu laikā)

Publicitātes un demonstrēšanas prasības projekta ieviešanas laikā

- ❑ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta simbolika un tās lietošanas noteikumi" (2016. gada 02. augusta rīkojums Nr. Nr.199)
http://lvif.gov.lv/uploaded_files/EKII/EKII_logo_noteikumi_010816.pdf
- ✓ 10 (desmit) darbdienu laikā **pēc projekta līguma parakstīšanas** savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) ievieto informāciju par projekta īstenošanu, turpmāk vēlams 1 reizi projekta pusgadā
- ✓ **Projekta īstenošanas laikā** noorganizē vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem
- ✓ Informatīvā plāksne un stends vai ekspozīcija pie objekta – obligāti pēc projekta pabeigšanas




Projekta līguma grozījumi

**Finansējuma saņēmējs informē Fondu par ikvienu izmaiņu,
kas var ietekmēt projekta ieviešanu!**

Pirms grozījumu veikšanas jāizvērtē:

- nepieciešamība veikt grozījumus
- atbilstība sākotnējam projekta mērķim – sasniedzamajiem rezultātiem (**CO₂; enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību**)
- kādas projekta aktivitātes grozījumi ietekmē



Tehniskie grozījumi projektā

Izmaiņas bankas rekvizītos:

- vēstule, kurā minēts jauns konta numurs

Izmaiņas kontaktinformācijā:

- vēstule, kurā minētas izmaiņas
- aktualizētā projekta iesnieguma 1.1.sadaļa (pamatdati), 1.2.sadaļa (atbildīgā persona) un/vai 1.3.sadaļa (kontaktpersona)

Izmaksu pārdalīšana starp projekta budžeta pozīcijām:

- vēstule, kurā minēts pamatojums, projekta ietvaros noslēgtie izpildes līgumi (ja iepriekš nav iesniegti)



Saturiskie grozījumi projektā

Grozījumi skar projekta aktivitātes (izmaiņas risinājumos, papildu darbi, darbu izslēgšana, aizvietošana utt.):

- **pavadvēstule**, kurā detalizēti aprakstīta grozījumu nepieciešamība, būtība un pamatojums
- **sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts (atzinums)** par iepriekš neparedzētiem konstatētiem apstākļiem, kas pamato grozījumu nepieciešamību, un piedāvātais risinājums
- **neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā atzinums** par oglekļa CO₂ emisijas samazinājuma rādītāja izmaiņām (pamatots ar aprēķiniem)
- koriģēta **tehniskā projekta grafiskā daļa**

Saturiskie grozījumi projektā (II)

- Aktualizētas visas tās **projekta iesnieguma sadaļas**, kuras skar izmaiņas
- Cita pamatojošā dokumentācija (kas apstiprina grozījumu pamatojumā minēto informāciju)
- Koriģētas būvniecības tāmes ar uzrādītajām pozīcijām, kuras tiek izslēgtas no tāmes (atbilstoši izmainītajai projekta grafiskajai daļai un energoauditam), papildinātas vai pievienotas no jauna:
 - ar dalījumu pa aktivitātēm (sienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa utt.) atbilstoši projektā apstiprinātā energoaudita aktivitātēm)
 - ar koptāmi (objekta tāmi) ar dalījumu atbalstāmajās un neatbalstāmajās izmaksās

!Tiks atbalstītas tikai tās izmaiņas, kas ir objektīvi nepieciešamas projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai un projekta mērķu sasniegšanai

Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu

- Ja pēc 1. ekspluatācijas gada CO₂ emisijas plānotais samazinājums nav sasniegts - iesniedz pasākumu plānu CO₂ emisijas samazinājuma neatbilstību novēršanai
- Plānu īsteno par saviem līdzekļiem gada laikā
- Ja pēc 2. ekspluatācijas gada atkārtoti konstatē, ka CO₂ emisijas plānotais samazinājums gadā nav sasniegts, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par EKII līdzekļu atgūšanu

Finanšu korekcijas

- Projektā nav iespējams veikt paredzētās darbības atbilstoši projekta mērķim, uzturēt projekta rezultātā radītos infrastruktūras objektus un nodrošināt projekta ilgtspēju pēc tā pabeigšanas – **100%**
- Iekārtām ir iestājušās būtiskas pārmaiņas, bet tās nav ietekmējušas projekta mērķi vai arī viss EKII atbalsts netika novirzīts iekārtu iegādei – **100% no attiecīgām izmaksām**
- Finansējuma saņēmējs ir pārtraucis savu darbību (uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ) pabeigšanas – **100%**
- Par EKII līdzekļiem iegādātā iekārta tiek pārdota, un vietā tiek nopirkta līdzīga iekārta – **labums no iekārtu pārdošana**

Finanšu korekcijas (II)

- Pēcuzraudzības termiņa laikā uzņēmums objektīvu iemeslu dēļ pārdod (atsavina) pamatlīdzekļus, kas iegādāti par EKII līdzfinansējumu – pirmo trīs gadu laikā 100 %; Ceturtajā gadā – 40%; Piektajā gadā – 20 % no pamatlīdzekļu iegādes vērtības
- Neto ieņēmumi, kas radušies piecu gadu laikā pēc darbības pabeigšanas un ir lielāki nekā iepriekš atskaitītie ieņēmumi – šie ieņēmumi jāņem vērā noslīguma procesā, attiecīgi koriģējot EKII atbalsta lielumu, ja nepieciešams. Ja izmaiņas ir mazākas par 10%, tad atmaksa netiek veikta

Finanšu korekcijas (III)

- Projektā ir plānotas darbības horizontālo prioritāšu jomās un projektu iesniegumu vērtēšanas procesā par darbībām horizontālo prioritāšu jomās ir piešķirti papildu punkti, bet projekta īstenošanas laikā tās nav sasniegtas/izpildītas un trūkumi vairs nevar tikt novērsti:
 - ja horizontālās prioritātes kritērijs ir bijis kā noteicošais, lai projekts varētu tikt apstiprināts, tad piemēro 100% korekciju
 - 25% finanšu korekcija, kas ir noteikta proporcionāli piešķirtā punktu skaitam projekta vērtēšanā pret kopējo piešķirto punktu skaitu.
 - 10% finanšu korekcija, kas ir noteikta proporcionāli piešķirtā punktu skaitam projekta vērtēšanā pret kopējo piešķirto punktu skaitu, ja ir daļēji izpildīts.

Finanšu korekcijas (IV)

- Krāpšanas gadījumi (neatkarīgi no tā, vai pārkāpums ir netīšs vai tīšs) – **100% korekciju piemēro izdevumiem, kas ir saistīti ar krāpnieciskām darbībām**
- Interesešu konflikts – **25%**
- Vizuālās identitātes un publicitātes prasību neizpilde atbilstoši normatīvo aktu prasībām – **2%**
- Noslēgtajā iepirkuma līgumā tiek veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz iepirkuma nosacījumiem, kas tikuši vērtēti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas procesā, piemēram, darbu izpildes termiņš, apmaksas kārtība u.c. – **25%** (100 % finanšu korekcija piemērojama, gadījumā, kad pilnībā tiek mainīts līguma priekšmets)

Finanšu korekcijas (V)

- Līguma priekšmets ir nepietiekami precīzi vai diskriminējoši definēts – **25% Korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Šo apmēru var samazināt līdz 10% vai 5% atkarībā no pārkāpuma nopietnības**
- Līgumā ietverto darbu apjomu samazināšana nesamazinot līguma vērtību, tai skaitā, lētāku materiālu un iekārtu izmantošana – **samazinātā darba apjoma vērtība, kā arī 25% korekcija no paveikto darbu vērtības**
- Iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto nogaidīšanas termiņu vai aizliegumu slēgt līgumu – **10% ja nav ievērots aizliegums slēgt, 5% ja nav ievērots nogaidīšanas termiņš**

Finanšu korekcijas (VI)

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa gadījumā, ja nav neparedzamu apstākļu izraisītas ārkārtas vajadzības – **100% korekcija tiek piemērota no papildu darbu (līguma) vērtības**
- Papildu būvdarbiem piešķirtā kopējā summa pārsniedz 50% no sākotnējā līguma summas – **100% korekciju piemēro summai, kura pārsniedz 50% no sākotnējā līguma vērtības**
- Iepirkuma dokumentācijā vai paziņojumā par līgumu netika iekļauti visi atlases un vērtēšanas kritēriji – **25% korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Šo apmēru var samazināt līdz 10% vai 5% atkarībā no pārkāpuma būtiskuma**

Finanšu korekcijas (VII)

- Nelikumīgu vērtēšanas kritēriju piemērošana – 25% korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Šo apmēru var samazināt līdz 10% vai 5% atkarībā no pārkāpuma būtiskuma
- Atlases kritēriju nepareiza/nelikumīga piemērošana – 25% korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Šo apmēru var samazināt līdz 10% vai 5% atkarībā no pārkāpuma būtiskuma
- Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas atbilstīgi publicitātes noteikumiem, taču vērtēšanas procedūrā ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips attiecībā uz uzņēmējiem – 10% korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Šo apmēru var samazināt līdz 5% atkarībā no pārkāpuma nopietnības

Finanšu korekcijas (VIII)

- Līguma izpildītājam pēc līguma noslēgšanas vai līguma realizācijas laikā tiek izmaksāts avanss, kas sākotnēji līgumā nebija paredzēts – ja avansa maksājuma apmērs nepārsniedz 20%, piemēro finanšu korekciju 10% apmērā nolīguma sākotnējās vērtības. Ja izmaksātais avanss pārsniedz 20% no līguma vērtības, piemēro korekciju izmaksātā avansa apmērā

Papildu nosacījumi

- ✓ **Uzturēt un saglabāt** Projekta ietvaros iegādātās un uzstādītās tehnoloģijas un iekārtas, kā arī izbūvētās un rekonstruētās būves un **atjaunot vai atvietot** tās zādzības gadījumā vai gadījumā, ja tās tiek bojātas vai iznīcinātas, no apdrošināšanas atlīdzības vai saviem līdzekļiem pilnā apmērā
- ✓ Dokumentu glabāšanas termiņš – **10 gadi no projekta īstenošanas beigām!**

<http://www.lvif.gov.lv>

<http://www.ekii.lv>



The screenshot shows the homepage of the EKII website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Sākums', 'Lapas karte', 'Palīdzība', and 'Kontakti'. The main header features the EKII logo and the text 'EKII Emisijas kvotu izsaiņošanas instruments'. Below the header, there are four main menu items: 'KONKURSI', 'INFORMATĪVE MATERIĀLI', 'STATISTIKA', and 'MONITORINGA PĀRSKATI'. The 'Sākums' section is highlighted, showing a news item dated 17 mar with the title 'VARAM aicina pieteikties finansīalam atbalstam'. The text of the news item mentions that the VARAM ministry is inviting applications for funding projects under the EKII system.

- aktuālā informācija
- līguma pielikumi
- vadlīnijas, piemēri
- u.c. informācija



Gaidīsim vienmēr ciemos Jūs uz konsultācijām!

Ieva Lazdiņa

Biroja tālrunis: 67845111

E-pasts: ekii@lvif.gov.lv

